



東広島高田道路 建設工事のお知らせ

主要地方道吉田豊栄線(東広島高田道路)道路改良工事(その2)

暮夏の折、皆様方におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
今年も早いもので半分が過ぎてしまい、時が経つというのは非常に早いと感じつつ、
東広島高田道路の早期完成を目指し、日々「安全第一・無事故無災害」を掲げるとともに
近隣の皆様方には引き続き、ご理解、ご協力を賜りながら、工事を進めてまいります。
さて、本工事も佳境に差し掛かり、吉田工区に於きましては無事に請負範囲の工事は完了致しました。
正力工区に於きましても、仕上げの舗装工事を進めており、8月中旬ごろまでには、請負範囲の
工事の完成の目的が立ってきたところです。

今年の暑さも昨年同様で格別でございますので、ご自愛専一にてお願い申し上げますとともに
引き続き、皆様方のご高配を賜りますよう、よろしくお申し上げます。

「現在の進捗と今後の予定」

工区 (詳細は裏面参照)	工種	令和5年4月	令和5年5月	令和5年6月	令和5年7月	令和5年8月	8月 末 進 め て 本 工 事 期 間 の 目 途 と し て ま い り ま す。
吉田工区1	アスファルト舗装工 排水構造物工	当工事の施工は全て完了しました。					
吉田工区2	アスファルト舗装工 排水構造物工						
トンネル工区	コンクリート舗装工 円形水路工・縁石工	当工事の施工は全て完了しました。					
トンネル工区	各種電気関係工事	電気関係工事が8月中旬より別工事で順次本格的に始まる予定です。					
正力工区	アスファルト舗装工 排水構造物工						
正力工区	残土処理工						仕上げ作業
7/24現在進捗率 90%	<p>7月は「正力工区」では、仕上げの舗装に取り掛かりました。 7月は「吉田工区」では、請負範囲は完了致しました。 8月は「正力工区」では、ガードレールの設置・防草コンクリート・片付けを予定しております。 8月は「吉田工区」では、作業はありません。</p> <p>引き続き、多くの工事用車両が出入りする場合は入口に交通誘導員を配備致します。</p>						

作成・請負者



〒739-0007

東広島市西条土与丸1丁目5-55

シンクコンストラクション(株)


082-423-5233

HP→ <https://thinkinc.co.jp/>

東広島高田道路の工事について

工事における他業者間の作業から生ずる諸問題を連絡・調整し、労働災害の未然防止と
施工の円滑な推進をはかることを目的として、「東広島高田道路安全協議会」を発足し、
運営しておりますが、この度、新規で3業者様が加入されましたのでご報告致します。
なお、工事に関するお問い合わせは、引き続きシンクコンストラクション(株)までお願い致します。

東広島高田道路安全協議会組織図

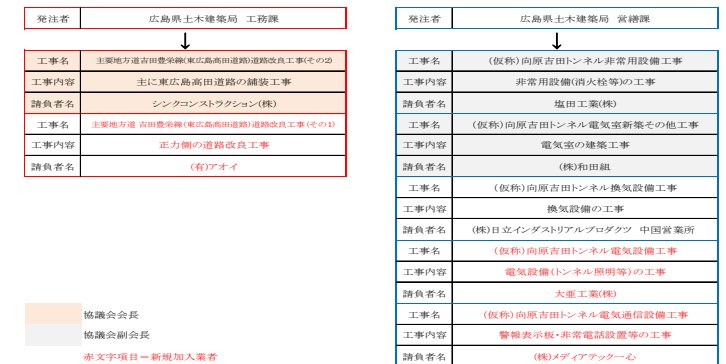

「正力工区」

8月中旬以降で下記の範囲(赤線部分の県道29号線)の工事が本格的に
開始される予定となっております。
「終日片側交互通行等」の交通規制を予定しております。
期間中はご協力のほどよろしくお願い致します。(詳細等は別途お知らせいたします)



裏面へ続く

7月末現在進捗状況



吉田工区

7月末現在、完了しました。

吉田工区1(上空より望む)

吉田工区1(地上より望む)

正力工区

7/24現在、仕上げの舗装に取り掛かっております。
(8月は、ガードレールの設置・防草コンクリート・片付けを予定しております。)

正力工区(上空より望む)

①方向

②方向

仕上げの舗装を行っており、工事の完了間近です。

正力工区(①方向より)

正力工区(②方向より)

