



東広島高田道路 安全協議会だより

東広島高田道路建設工事現場より

向春の候、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、6社合同での広報誌発行となりますが、全業者で力を合わせて、

東広島高田道路の一日でも早い完成と、より良い工事の情報を発信していこうと、頑張っています。

令和5年12月より、トンネル坑内の各作業(消防設備・電気設備他)が本格始動しております。


トンネル坑内のため、各業者が入り混じっての作業もありますが、安全第一・無事故無災害を念頭に置きながら工事を進めて参ります。

また、皆様方には工事の進み具合が、目に見てわからない時期に入っていますが、

トンネル坑内で各業者が頑張っているんだな。と温かい目で見守って頂ければと思います。

最後になりますが、工事に関するお問い合わせは、右上の通りでございますと共に、



向春のみぎり、健康には十分にご留意なされ、さらにご活躍されますことを祈念申し上げます。



「各工区の予定と実績」


工区	工事内容	担当業者	令和5年12月	令和6年1月	令和6年2月	令和6年3月	令和6年4月	令和6年5月	令和6年6月	1月末現在 進捗率
吉田工区①	国道54号 交差点改良	準備中	予定 実施	工事発注に向けて各種関係機関と協議中。						
吉田工区②	アスファルト舗装工 排水構造物工他	準備中	予定 実施	工事発注に向けて各種関係機関と協議中。						
トンネル工区①	非常用設備 (消火栓等)	塩田工業(株)	予定 実施							65.0%
トンネル工区②	換気設備	(株)日立インダストリアル プロダクツ 中国営業所	予定 実施							69.0%
トンネル工区③	電気設備 (トンネル照明等)	大亜工業(株)	予定 実施							3.2%
トンネル工区④	警報表示板 ・非常電話設置等	(株)メディアテックー心	予定 実施							25.0%
トンネル工区⑤	電気室建築	(株)和田組	予定 実施	※設計変更に伴う見直しで「R5.9.1～R6.2.29(予定)」まで工事一時中止中。						
正力工区①	アスファルト舗装工 排水構造物工他	(有)アオイ	予定 実施							68.0%
										75.0%

各工区の進捗状況につきましては裏面をご覧ください。


作成代表者 	〒730-0825 広島市中区光南六丁目3番81号 大亜工業株式会社 082-241-4281 https://www.daia.co.jp/
工事に関する 問い合わせ先 	広島県西部建設事務所 工務第二課 電話:082-250-8156(担当: 齋那・田中・竹田・柳本) 広島県 土木建築局 営繕課 電話:082-224-4198(担当: 磯道・名郷・棗田)

進捗状況


吉田側坑口より




正力側坑口より



坑内の状況



主に電気配管、ハンドホール設置、監査廊設置、配水本管接続、アンカー打設を施工中です。



東広島高田道路に於ける進捗状況(2024年1月末現在)

吉田工区①

準備中

担当業者: 現在、発注に向けて準備中



国道54号線と
東広島高田道路の
交差点改良工事

吉田工区②

準備中

担当業者: 現在、発注に向けて準備中



アスファルト舗装
各種電気工事他

トンネル工区①



担当業者: 塩田工業(株)



非常用設備
(消火栓等)
の工事

トンネル工区②

準備中

担当業者: (株)日立インダストリアル
プロダクツ 中国営業所



換気設備
の工事

全体図



トンネル工区③



担当業者: 大亜工業(株)



電気設備
(トンネル照明等)
の工事

トンネル工区④



担当業者: (株)メディアテックー心



警報表示板・
非常電話設置等
の工事

正力工区全体




正力工区①



担当業者: (有)アオイ

道路改良工事中です。

吉田豊栄線と
東広島高田道路の
交差点改良工事

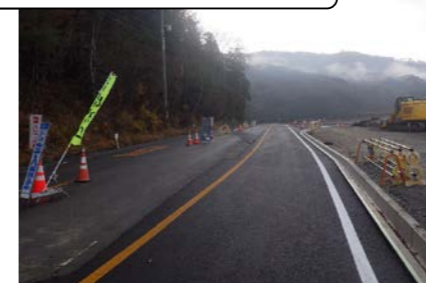

トンネル工区⑤



担当業者: (株)和田組

設計見直しで、一時中止中です

電気室の
建築工事

